



ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO Nº 49 / 2018 SEI GESB- 06090**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**1. APRESENTAÇÃO**

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**.

Consta desse relatório os resultados da fiscalização realizada no dia 16 de julho de 2018 no município de **Novo Gama**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (**GRS**) de **Luziânia**.

**2. OBJETIVOS**

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da SANEAGO no município de **Novo Gama**, envolvendo o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, manutenção do sistema e o atendimento comercial aos usuários;
- Atender a solicitação do **Ministério Público do Estado de Goiás**, representado pela Promotora de Justiça **Cláudia Gomes (1ª PJNG)**, de realização de perícia técnica para verificar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pertinente à implementação e ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito de Novo Gama.

**3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO**

- Reunião com o gerente;
- Vistoria *in loco* nas unidades de abastecimento de água objetos Termo de Ajustamento de Conduta;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos.

**4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO**

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Adolfo José de Oliveira	Supervisor de Produção	Saneago

**5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS**

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Luziânia**, devidamente identificada a

seguir:

<b>Endereço</b>	Av. Santa Maria Qd. 28 Lt. 09 Setor Aeroporto
<b>Cidade/Estado</b>	Luziânia
<b>DDD/Telefone/Fax</b>	(61) 3622 1712
<b>Gerente</b>	Hélio B. Leão

## 6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Atender determinação do **Ministério Público do Estado de Goiás 1ª Promotoria de Justiça de Novo Gama** de realizar perícia para exame do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pertinente à implementação e ampliação do sistema de abastecimento de água dos seguintes setores: Bairro Santa Luzia, Residencial Negreiros, Residencial Alphaville, Residencial Lunabel, Bairro Lago Azul, Boa Vista I. Constatar se houve interligação dos poços tubulares profundo P15, P16 e P03 até a ETA.

## 7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Após a realização da fiscalização em atendimento a solicitação da 1ª PJNG, realizada por meio do Ofício nº 156/2018, foi realizada a fiscalização das obras e ações realizadas pela SANEAGO para a implementação e ampliação do sistema de abastecimento de água dos setores Bairro Santa Luzia, Residencial Negreiros, Residencial Alphaville, Residencial Lunabel, Bairro Lago Azul, Boa Vista I, verificando-se a seguinte situação:

### 7.1. Bairro Santa Luzia

- Executadas obras de implantação do SAA;
- Construção do Centro de Reservação Santa Luzia;
- Adutora de água bruta concluída;
- Urbanização do poço P 14 (foto 05);
- Centro de Reservação Santa Luzia encontra-se pronto e em funcionamento e é composto de: 1 R.A.P metálico de 200 m<sup>3</sup> (foto 01), 1 R.E.L metálico de 50 m<sup>3</sup> (foto 02) e Casa de química (foto 03).
- Urbanização do C.R. Santa Luzia (foto 04).

### 7.2. ETA

- Obras de interligação dos poços P15 e P16 a ETA concluída (foto 06 e 07);
- Falta urbanização dos poços P15 e P16.
- Poço P03 não foi interligado devido à baixa vazão.

### 7.3. Boa Vista

- Obras de implantação do SAA concluídas;
- O Centro de Reservação Boa Vista, abastece hoje os seguintes setores:
- Residencial Negreiros, Alpha Ville e Boa Vista I e II (fotos 08 e 09);
- O Centro e Reservação Boa Vista encontra-se pronto e em funcionamento e é composto de: 1 R.A.P metálico de 100 m<sup>3</sup>, 1 R.A.P concreto de 300 m<sup>3</sup>, 1 R.A.P concreto de 1000 m<sup>3</sup> e 1 R.E.L concreto de 100 m<sup>3</sup>.

### 7.4. Lunabel

- Obras concluídas de implantação de rede de água nos setores Lunabel e Boa Vista I, casas populares;
- Casas populares Boa Vista I (fotos 10 e 11)
- Casas populares Lunabel (foto 12)

- O Centro e Reservação Lunabel encontra-se pronto e em funcionamento e é composto de: 1 R.A.P concreto de 500 m<sup>3</sup> e 1 R.E.L metálico de 50 m<sup>3</sup>.

#### 7.5. Residencial Lago Azul

- Obras de implantação do SAA executadas;
- O Centro de Reservação Lago Azul encontra-se pronto e em funcionamento e é composto de: 1 R.A.P concreto de 1000 m<sup>3</sup>, 1 R.E.L concreto de 100 m<sup>3</sup>.
- Adutora de água bruta construída (2.500 m);
- Poços tubulares profundo interligados a uma caixa de reunião localizada na área da E.E.E. (foto 14), sendo eles: Poço 05 (foto 15), Poço 12 (foto 16), Poço 22 (foto 17) Poço 28 (foto 18) e Poço 29 (foto 19).

#### 7.6. Residencial Negreiros

- O Residencial Negreiros é abastecido pelo Centro de Reservação Boa Vista onde as obras de implantação do SAA foram concluídas.

#### 7.7. Residencial Alphaville

- O Residencial Alphaville é abastecido pelo Centro de Reservação Boa Vista onde as obras de implantação do SAA foram concluídas.

A equipe técnica da A.G.R após fiscalização realizada no município de Novo Gama, concluiu que as obras fiscalizadas encontram em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta pertinente à implementação e ampliação do sistema de abastecimento de água dos setores acima descritos.

#### 9.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Foto 1** - C.R. Santa Luzia R.A.P metálico 200 m<sup>3</sup>.



**Foto 2** - R.E.L setor Santa Luzia metálico 50 m<sup>3</sup>.



**Foto 3** - C.R. Santa Luzia casa de química.



**Foto 4** - C.R. Santa Luzia urbanizado.



**Foto 5** - Poço 14 urbanizado bairro Santa Luzia.



**Foto 6** - Poço P 15 interligado a ETA (sem urbanização).



**Foto 7** - Poço P 16 interligado a ETA (sem urbanização).



**Foto 8** - C.R. Boa Vista identificado.

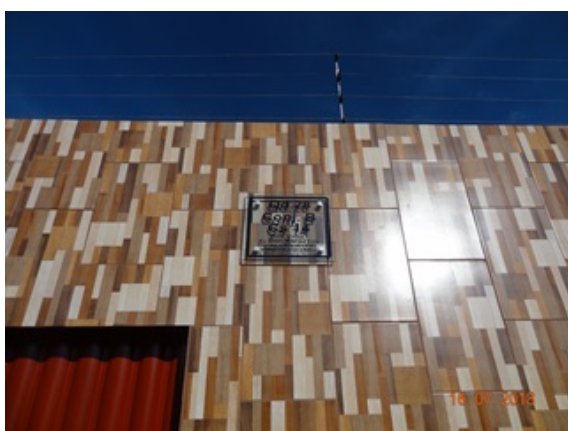




**Foto 9** - C.R. Boa Vista com reservatórios instalados.



**Foto 10** - C.R. Setor Lunabel com reservatórios instalados.



**Foto 11** - Casas populares Boa Vista I.



**Foto 12** - Casas populares Lunabel.



**Foto 13** - C.R. Lago Azul.



**Foto 14** - Caixa de Reunião com poços interligados.



Foto 15 - Poço P 05 interligado à caixa de reunião.



Foto 16 - Poço P 12 interligado à caixa de reunião.



Foto 17 - Poço P 22 interligado à caixa de reunião.



Foto 18 - Poço P 28 interligado à caixa de reunião.



Foto 19 - Poço P 29 interligado à caixa de reunião.

Goiânia, 03 de agosto de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS**, Técnico em Mineração, em 04/09/2018, às 09:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**, Gerente, em 04/09/2018, às 14:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador 3402057 e o código CRC



026B8F21.

---

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO  
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029005069



SEI 3402057
